



PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA

PROGRAM :
PENYELENGARAAN JALAN

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :
REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :
REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS ~ SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)

KONTRAK :
600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
TANGGAL 17 MEI 2024

WAKTU PELAKSANAAN :
210 (DUA RATUS SEPULUH) HARI KALENDER

LAPORAN BULAN JULI

KONSULTAN PENGAWAS:
CV.MARVON KARYA ARSIMETRIS
PUSAT PALANGKA RAYA


PENYEDIA JASA KONSTRUKSI:
PT.SANGGA BUANA MULTI KARYA
PUSAT PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS – SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)
LOKASI : KECAMATAN MIHING RAYA DAN SEPANG
NILAI KONTRAK : RP. 19.429.776.800,-
NOMOR KONTRAK : 600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI : PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS : CV. MARVON KARYA ARSIMETRIS

TANGGAL 17 MEI 2024
PUSAT PALANGKA RAYA
PUSAT PALANGKA RAYA

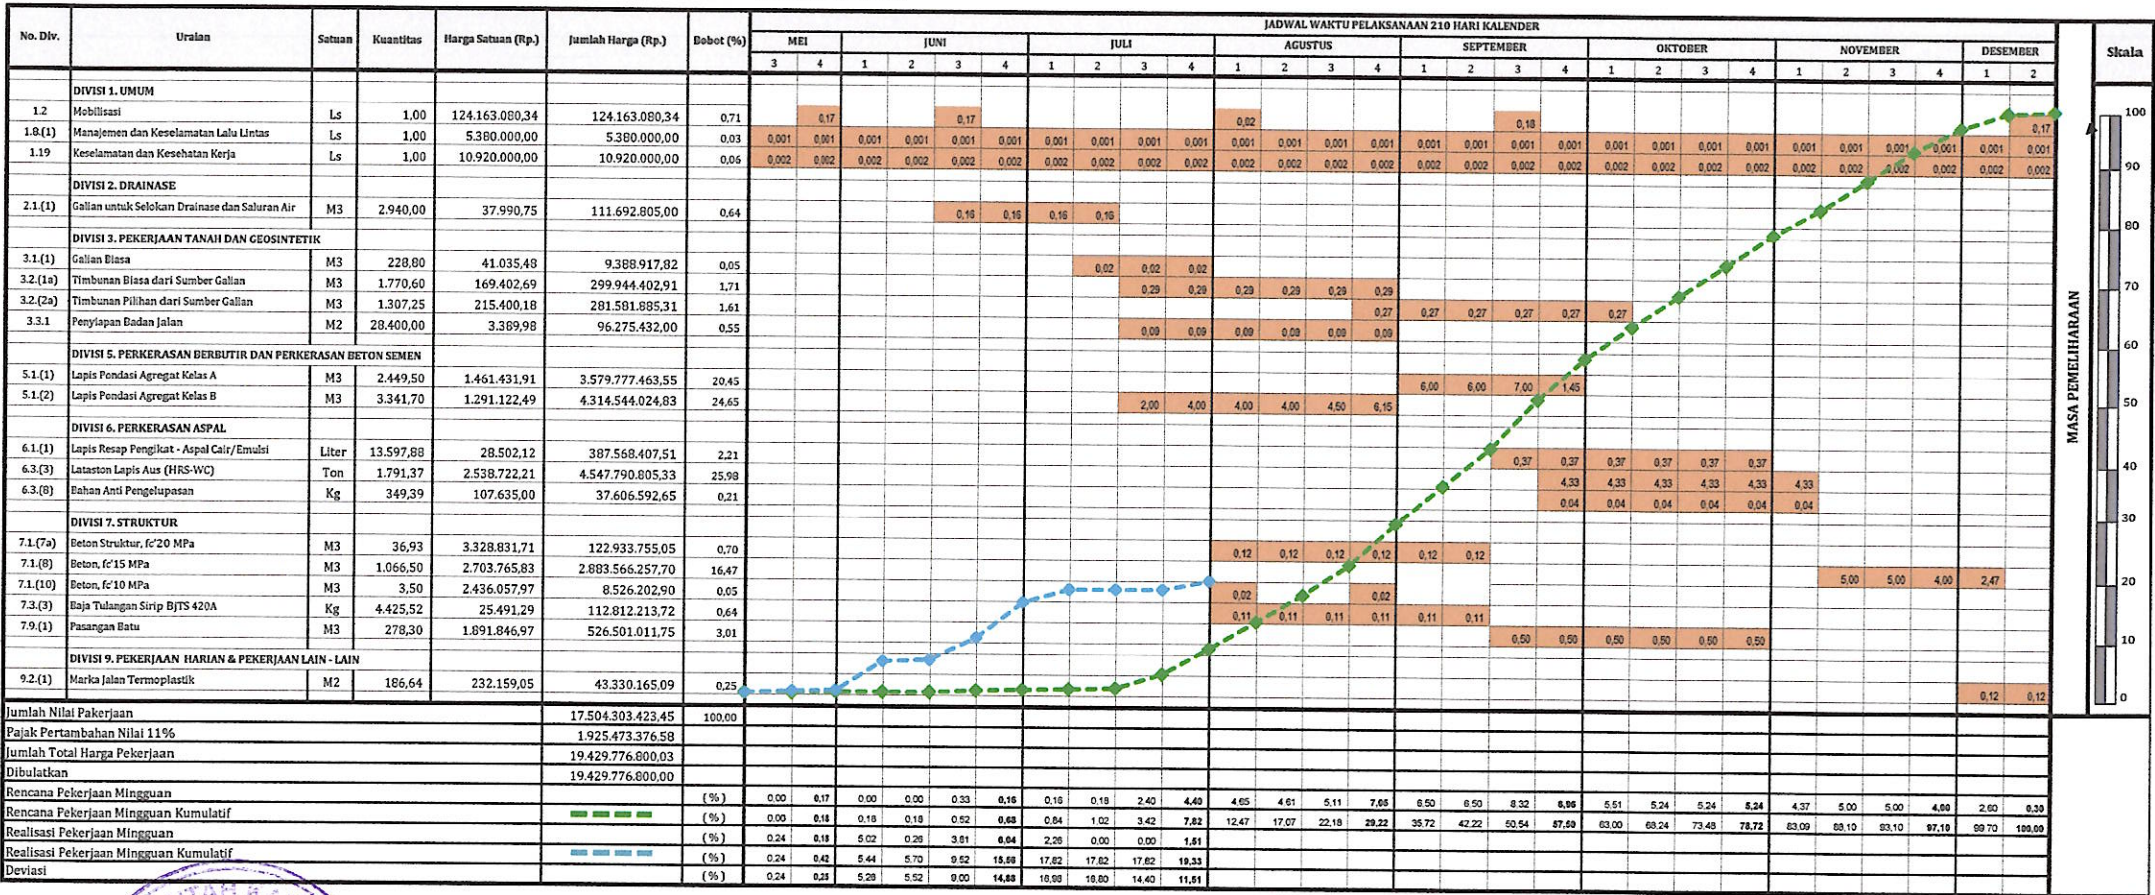



PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA

PROGRAM :

PENYELENGARAAN JALAN

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :

REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)

KONTRAK :

600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024

TANGGAL 17 MEI 2024

WAKTU PELAKSANAAN :

210 (DUA RATUS SEPULUH) HARI KALENDER

LAPORAN BULAN AGUSTUS

**KONSULTAN PENGAWAS:
CV.MARVON KARYA ARSIMETRIS
PUSAT PALANGKA RAYA**

**PENYEDIA JASA KONSTRUKSI:
PT.SANGGA BUANA MULTI KARYA
PUSAT PALANGKA RAYA**

TAHUN ANGGARAN 2024

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
 KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
 SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
 PEKERJAAN : REKONSTRUKSI JALAN TUMBUANG EMPAS – SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)
 LOKASI : KECAMATAN MIHING RAYA DAN SEPANG
 NILAI KONTRAK : RP. 19.429.776.800,-
 NOMOR KONTRAK : 600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
 PENYEDIA JASA KONSTRUKSI : PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. MARVON KARYA ARSINETRIS

TANGGAL 17 MEI 2024
 PUSAT PALANGKA RAYA
 PUSAT PALANGKA RAYA

No. Div.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 210 HARI KALENDER																								Masa Pemeliharaan	Skala				
							MEI		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
							3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			3	4	1	2
	DIVISI 1. UMUM																																			
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	124.163.080,34	124.163.080,34	0,71		0,17			0,17				0,02					0,19																
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	1,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,03	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001			
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	10.920.000,00	10.920.000,00	0,06	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002			
	DIVISI 2. DRAINASE																																			
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	2.940,00	37.990,75	111.692.805,00	0,64					0,16	0,16	0,16	0,16																						
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																																			
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	228,80	41.035,48	9.388.917,82	0,05							0,02	0,02	0,02																					
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	1.770,60	169.402,69	299.944.402,91	1,71							0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29																	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1.307,25	215.400,18	281.581.885,31	1,61												0,27	0,27	0,27	0,27	0,27														
3.3.1	Penyiapan Badan Jalan	M2	28.400,00	3.389,98	96.275.432,00	0,55							0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09																	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																																			
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2.449,50	1.461.431,91	3.579.777.463,55	20,45															6,00	6,00	7,00	1,45												
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	3.341,70	1.291.122,49	4.314.544.024,83	24,65							2,00	4,00	4,00	4,00	4,50	5,15																		
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																																			
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	13.597,88	28.502,12	387.568.407,51	2,21															0,37	0,37	0,37	0,37	0,37											
6.3.(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	1.791,37	2.538.722,21	4.547.790.805,33	25,98															4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33										
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	349,39	107.635,00	37.606.592,65	0,21															0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04										
	DIVISI 7. STRUKTUR																																			
7.1.(7a)	Beton Struktur, f'c 20 MPa	M3	36,93	3.328.831,71	122.933.755,05	0,70											0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12														
7.1.(8)	Beton, f'c 15 MPa	M3	1.066,50	2.703.765,83	2.883.566.257,70	16,47																														
7.1.(10)	Beton, f'c 10 MPa	M3	3,50	2.436.057,97	8.526.202,90	0,05											0,02				0,02															
7.3.(3)	Baja Tulangan Srip BJTS 420A	Kg	4.425,52	25.491,29	112.812.213,72	0,64											0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11														
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	278,30	1.891.846,97	526.501.011,75	3,01																		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50							
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN																																			
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	186,64	232.159,05	43.330.165,09	0,25																											0,12	0,12		
Jumlah Nilai Pekerjaan					17.504.303.423,45	100,00																														
Pajak Pertambahan Nilai 11%					1.925.473.376,58																															
Jumlah Total Harga Pekerjaan					19.429.776.800,03																															
Dibulatkan					19.429.776.800,00																															
Rencana Pekerjaan Mingguan						(%)	0,00	0,17	0,00	0,00	0,33	0,16	0,16	0,16	2,40	4,49	4,65	4,61	5,11	7,65	6,50	6,50	8,32	6,98	5,51	5,24	5,24	6,34	4,37	5,00	5,00	4,00	2,90	0,39		
Rencana Pekerjaan Mingguan Kumulatif						(%)	0,00	0,18	0,18	0,18	0,52	0,68	0,84	1,02	3,42	7,82	12,47	17,07	22,18	29,22	35,72	42,22	50,54	57,59	63,00	68,24	73,48	78,72	83,09	88,10	93,10	97,19	99,70	100,00		
Realisasi Pekerjaan Mingguan						(%)	0,24	0,18	5,02	0,29	3,81	0,84	2,28	0,00	0,00	1,51	4,90	6,81	7,96	0,83																
Realisasi Pekerjaan Mingguan Kumulatif						(%)	0,24	0,42	5,44	5,70	9,52	10,36	12,64	12,64	14,45	16,26	21,16	27,97	34,84	41,00	41,00															
Deviasi						(%)	0,24	0,25	5,28	5,52	9,00	14,88	16,08	16,00	14,40	11,61	11,75	15,90	18,82	11,77																



Diperiksa oleh:
 Konsultan Pengawas
CV. MARVON KARYA ARSINETRIS
 Pusat Palangka Raya

KRISTIAN, ST.
 Site Engineer

Dibuat Oleh:
 Penyedia Jasa Konstruksi
PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
 Pusat Palangka Raya

HENDRA ARIEF, B.Eng.
 Direktur



PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA

PROGRAM :
PENYELENGARAAN JALAN

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :
REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :
REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)

KONTRAK :
600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
TANGGAL 17 MEI 2024

WAKTU PELAKSANAAN :
210 (DUA RATUS SEPULUH) HARI KALENDER

LAPORAN BULAN SEPTEMBER


KONSULTAN PENGAWAS:
CV.MARVON KARYA ARSIMETRIS
PUSAT PALANGKA RAYA

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI:
PT.SANGGA BUANA MULTI KARYA
PUSAT PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN	
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	
SUB KEGIATAN	:	REKONSTRUKSI JALAN	
PEKERJAAN	:	REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS – SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)	
LOKASI	:	KECAMATAN MIHING RAYA DAN SEPANG	
NILAI KONTRAK	:	RP. 19.429.776.800,-	
NOMOR KONTRAK	:	600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024	TANGGAL 17 MEI 2024
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI	:	PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA	PUSAT PALANGKA RAYA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV. MARVON KARYA ARSIMETRIS	PUSAT PALANGKA RAYA

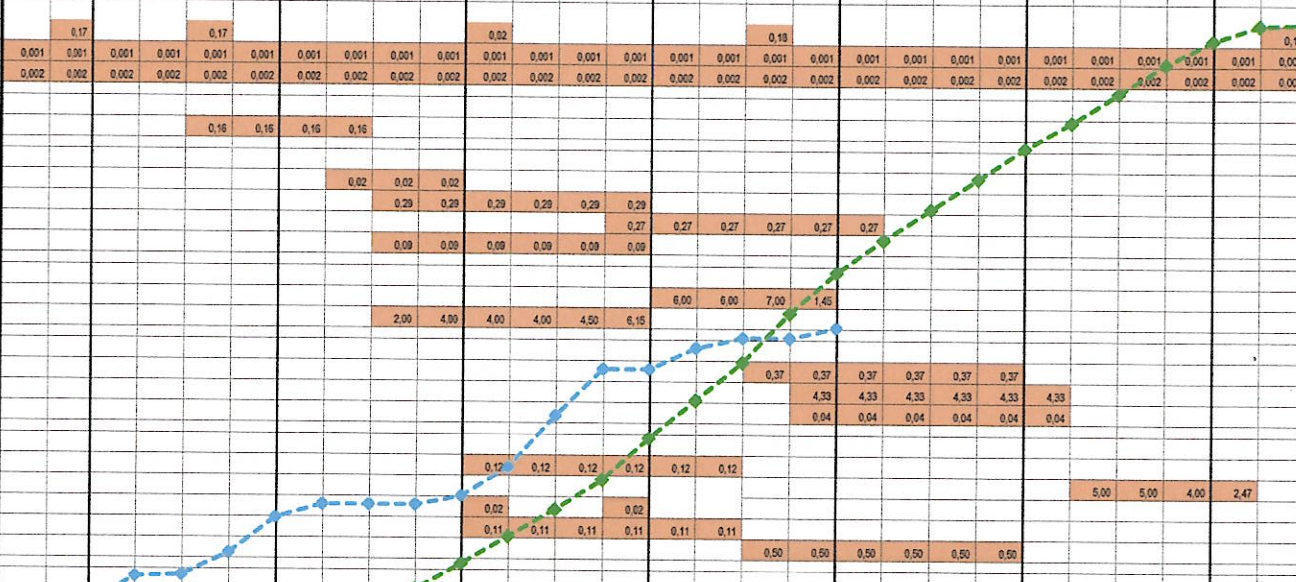No. Div.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 210 HARI KALENDER																								Skala				
							MEI		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER		
							3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4	1	2
DIVISI 1. UMUM																																			
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	124.163.080,34	124.163.080,34	0,71																													
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	1,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,03																													
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	10.920.000,00	10.920.000,00	0,66																													
DIVISI 2. DRAINASE																																			
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	2.940,00	37.990,75	111.692.805,00	0,64																													
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																																			
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	228,80	41.035,48	9.388.917,82	0,65																													
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	1.770,60	169.402,69	299.944.402,91	1,71																													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1.307,25	215.400,18	281.581.885,31	1,61																													
3.3.1	Penyiapan Badan Jalan	M2	28.400,00	3.389,98	96.275.432,00	0,55																													
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																																			
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2.449,50	1.461.431,91	3.579.777.463,55	20,45																													
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	3.341,70	1.291.122,49	4.314.544.024,83	24,65																													
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																																			
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	13.597,88	28.502,12	387.568.407,51	2,21																													
6.3.(3)	Latatan Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	1.791,37	2.538.722,21	4.547.790.805,33	25,98																													
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	349,39	107.635,00	37.606.592,65	0,21																													
DIVISI 7. STRUKTUR																																			
7.1.(7a)	Beton Struktur, f'c 20 MPa	M3	36,93	3.328.831,71	122.933.755,05	0,70																													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 MPa	M3	1.066,50	2.703.765,83	2.889.566.257,70	16,47																													
7.1.(10)	Beton, f'c 10 MPa	M3	3,50	2.436.057,97	8.526.202,90	0,05																													
7.3.(3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	4.425,52	25.491,29	112.812.213,72	0,64																													
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	278,30	1.891.846,97	526.501.011,75	3,01																													
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN																																			
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	186,64	232.159,05	43.330.165,09	0,25																													
Jumlah Nilai Pekerjaan																																			
Pajak Pertambahan Nilai 11%																																			
Jumlah Total Harga Pekerjaan																																			
Dibulatkan																																			
Rencana Pekerjaan Mingguan																																			
Rencana Pekerjaan Mingguan Kumulatif																																			
Realisasi Pekerjaan Mingguan																																			
Realisasi Pekerjaan Mingguan Kumulatif																																			
Deviasi																																			



Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. MARVON KARYA ARSIMETRIS
Pusat Palangka Raya
[Signature]
KUSNIAH, S.T.
081 5911 9999
CV. MKA

Dibuat Oleh :
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
Pusat Palangka Raya

HENDRA ARIEF, B.Eng.
Direktur



PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA

PROGRAM :

PENYELENGARAAN JALAN

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :

REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)

KONTRAK :

600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024

TANGGAL 17 MEI 2024

WAKTU PELAKSANAAN :

210 (DUA RATUS SEPULUH) HARI KALENDER

LAPORAN BULAN OKTOBER

KONSULTAN PENGAWAS:

CV.MARVON KARYA ARSIMETRIS

PUSAT PALANGKA RAYA

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI:

PT.SANGGA BUANA MULTI KARYA


PUSAT PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : REKONSTRUKSI JALAN TUMBAH EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)
LOKASI : KECAMATAN MIHING RAYA DAN SEPANG
NILAI KONTRAK : RP. 19.429.776.800,-
NOMOR KONTRAK : 600.19.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI : PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS : CV. MARVON KARYA ARSINETRIS

TANGGAL 17 MEI 2024
PUSAT PALANGKA RAYA
PUSAT PALANGKA RAYA

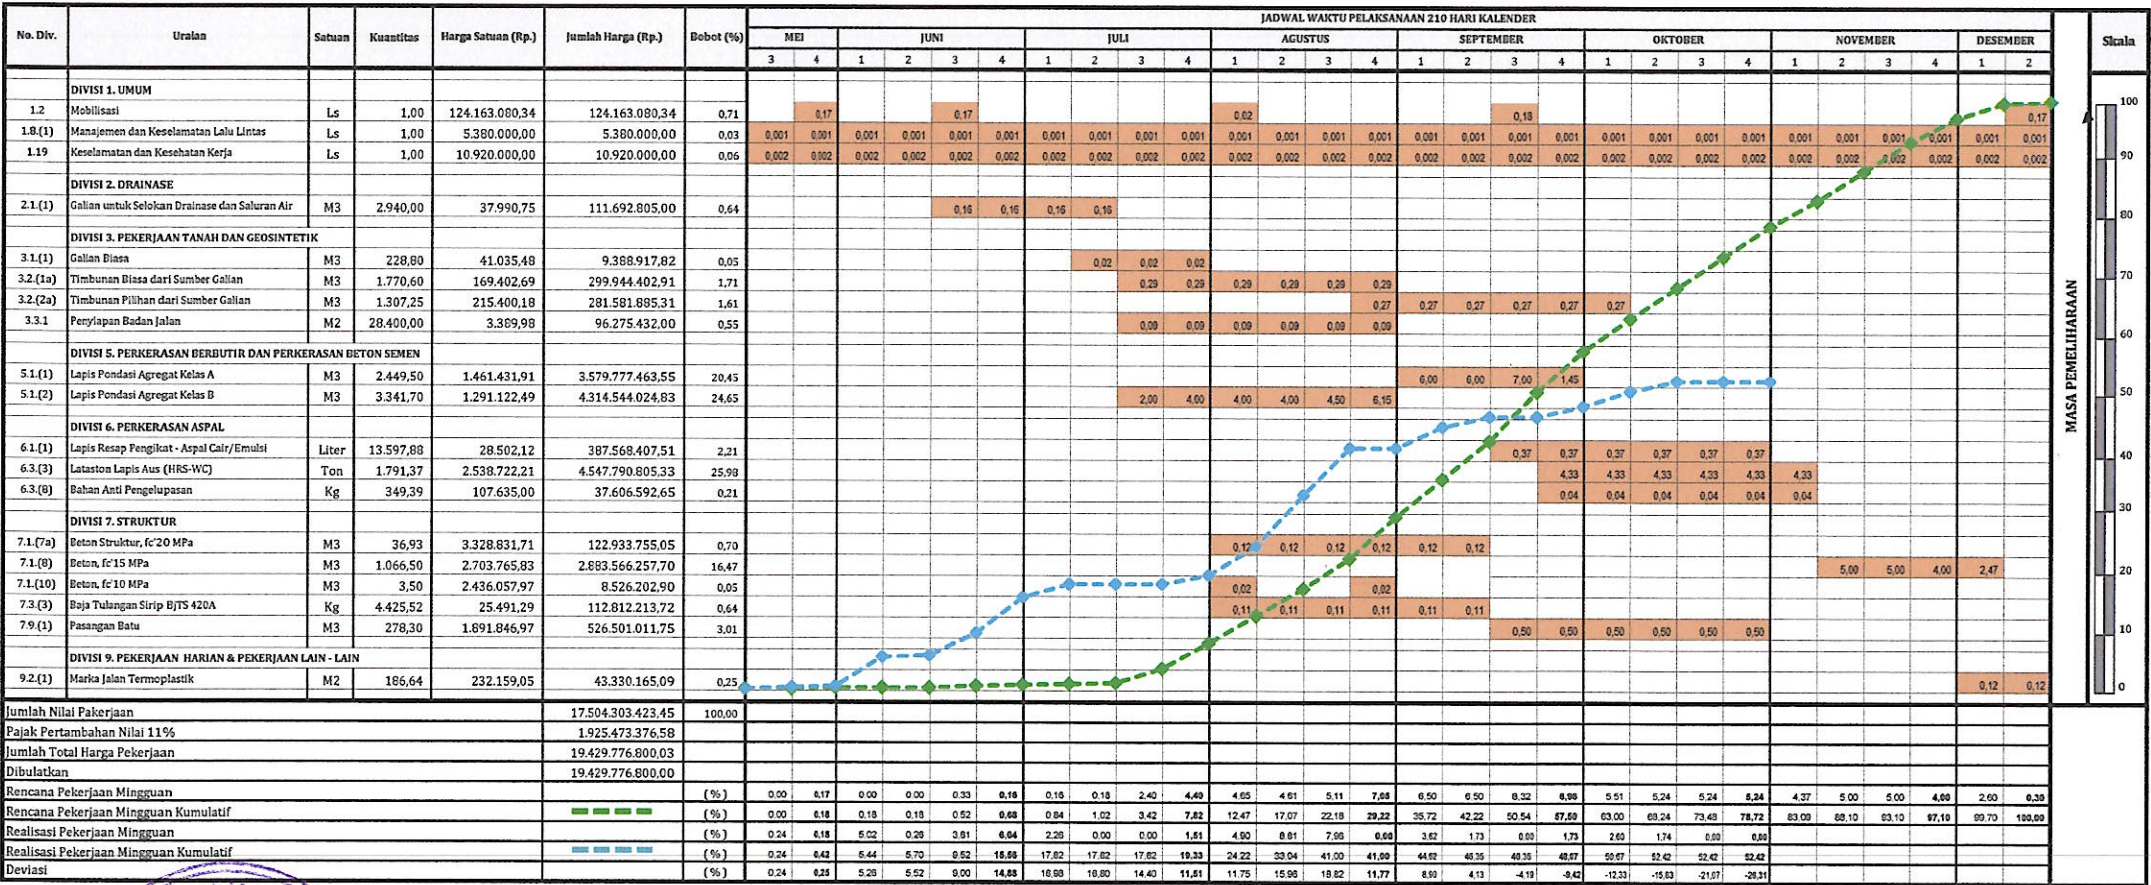



PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA

PROGRAM :
PENYELENGARAAN JALAN

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :
REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :
REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)

KONTRAK :
600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
TANGGAL 17 MEI 2024

ADDENDUM - I :
600.1.9.3/318.33/ADD-I/DAK-FE/DPU-BM/XI/2024
TANGGAL 29 NOVEMBER 2024

WAKTU PELAKSANAAN :
222 (DUA RATUS DUA PULUH DUA) HARI KALENDER

LAPORAN BULAN NOVEMBER

KONSULTAN PENGAWAS:
CV.MARVON KARYA ARSIMETRIS
PUSAT PALANGKA RAYA

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI:
PT.SANGGA BUANA MULTI KARYA
PUSAT PALANGKA RAYA


TAHUN ANGGARAN 2024

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
 KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
 SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
 PEKERJAAN : REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)
 LOKASI : KECAMATAN MIHING RAYA DAN SEPANG
 NILAI KONTRAK : RP. 19.429.776.800,-
 NOMOR KONTRAK : 600.193/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
 PENYEDIA JASA KONSTRUKSI : PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. MARVON KARYA ARSIMETRIS

TANGGAL 17 MEI 2024
 PUSAT PALANGKA RAYA
 PUSAT PALANGKA RAYA

No. Div.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 210 HARI KALENDER																								Masa Pemeliharaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							MEI		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DIVISI 1. UMUM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



Diperiksa oleh :
 Konsultan Pengawas
CV. MARVON KARYA ARSIMETRIS
 Pusat Palangka Raya
 Site Engineer
CV. MKA

Dibuat Oleh :
 Penyedia Jasa Konstruksi
PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
 Pusat Palangka Raya
 Direktur
HENDRA ARIEF, B.Eng.



PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA

PROGRAM :
PENYELENGARAAN JALAN

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN :
REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :
REKONSTRUKSI JALAN TUMBANG EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)

KONTRAK :
600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
TANGGAL 17 MEI 2024

ADDENDUM - I :
600.1.9.3/318.33/ADD-I/DAK-FE/DPU-BM/XI/2024
TANGGAL 29 NOVEMBER 2024

WAKTU PELAKSANAAN :
222 (DUA RATUS DUA PULUH DUA) HARI KALENDER

LAPORAN BULAN DESEMBER

KONSULTAN PENGAWAS:
CV.MARVON KARYA ARSIMETRIS
PUSAT PALANGKA RAYA

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI:
PT.SANGGA BUANA MULTI KARYA
PUSAT PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN ADDENDUM - I (DENDA)

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : REKONSTRUKSI JALAN TUMBAH EMPAS - SEPANG SIMIN (DAK TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)
LOKASI : KECAMATAN MIHING RAYA DAN SEPANG
NILAI KONTRAK : RP. 19.429.776.800,-
NOMOR KONTRAK : 600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
NOMOR ADDENDUM - I : 600.1.9.3/318.33/ADD-I/DAK-FE/DPU-BM/XI/2024
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI : PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS : CV. MARVON KARYA ARSINETRIS

TANGGAL 17 MEI 2024
TANGGAL 29 NOVEMBER 2024
PUSAT PALANGKA RAYA
PUSAT PALANGKA RAYA

No. Div.	Uraian	KONTRAK				ADDENDUM - I				JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 222 HARI KALENDER																																																Sisa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.2	DIVISI 1. UMUM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



Diperiksa oleh:
Konsultan Pengawas
CV. MARVON KARYA ARSINETRIS
Pusat Palangka Raya
Sip. 019.000.000.000
CV. MKA

Dibuat Oleh:
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
Pusat Palangka Raya
Sip. 019.000.000.000
HENDRA MULIA
Direktur
